N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	**Faisabilité**	**152 jours**	**Mar 21/11/23**	**Jeu 20/06/24**
14	**Consultation candidatures**	**140 jours?**	**Ven 26/04/24**	**Jeu 07/11/24**
15	Rédaction des pièces administratives	11 jours	Ven 26/04/24	Ven 10/05/24
16	Echange et validation des pièces admin	8 sm	Lun 13/05/24	Ven 05/07/24
17	Publication AAPC	5 jours	Jeu 27/06/24	Mer 03/07/24
18	Consultation candidatures	45 jours	Jeu 04/07/24	Mer 04/09/24
19	Analyse des candidatures	3 sm	Jeu 05/09/24	Mer 25/09/24
20	Commision technique	2 sm	Jeu 26/09/24	Mer 09/10/24
21	Jury	1 jour?	Jeu 24/10/24	Jeu 24/10/24
22	Notification des candidats	1 sm	Ven 01/11/24	Jeu 07/11/24
23	**DCE**	**150 jours**	**Ven 12/04/24**	**Jeu 07/11/24**
24	programme	7 sm	Ven 12/04/24	Jeu 30/05/24
25	Validation du Programme	3 sm	Ven 31/05/24	Jeu 20/06/24
26	cadre de réponse + cadre d'analy	11 sm	Ven 12/04/24	Jeu 27/06/24
27	pièces administratives	11 sm	Ven 12/04/24	Jeu 27/06/24
28	Reprise du programme	2 sm	Ven 21/06/24	Jeu 04/07/24
29	Publication du DCE	0 jour	Jeu 07/11/24	Jeu 07/11/24
30	**Consultation Offres**	**225 jours**	**Ven 08/11/24**	**Jeu 18/09/25**
31	Constitution des offres initiales	10 sm	Ven 08/11/24	Jeu 16/01/25
32	Réception des offres	0 jour	Jeu 16/01/25	Jeu 16/01/25
33	Analyse des offres	4 sm	Ven 17/01/25	Jeu 13/02/25
34	Commission technique	1 sm	Ven 21/02/25	Jeu 27/02/25
35	Audition des groupements	1 sm	Ven 14/03/25	Jeu 20/03/25
36	Rédaction du DDOF	3 sm	Ven 21/03/25	Jeu 10/04/25
37	Echanges et validation	2 sm	Ven 11/04/25	Jeu 24/04/25
38	Constituion des offres finales	8 sm	Ven 25/04/25	Jeu 19/06/25
39	Analyse des Offres	3 sm	Ven 20/06/25	Jeu 10/07/25
40	Commission technique	2 sm	Ven 18/07/25	Jeu 31/07/25
41	Jury offres finales	1 sm	Ven 15/08/25	Jeu 21/08/25
42	Notification et mise au point du marché	3 sm	Ven 29/08/25	Jeu 18/09/25
43	Conception	10 mois	Ven 17/10/25	Jeu 23/07/26
44	Travaux	23 mois	Ven 24/07/26	Jeu 27/04/28

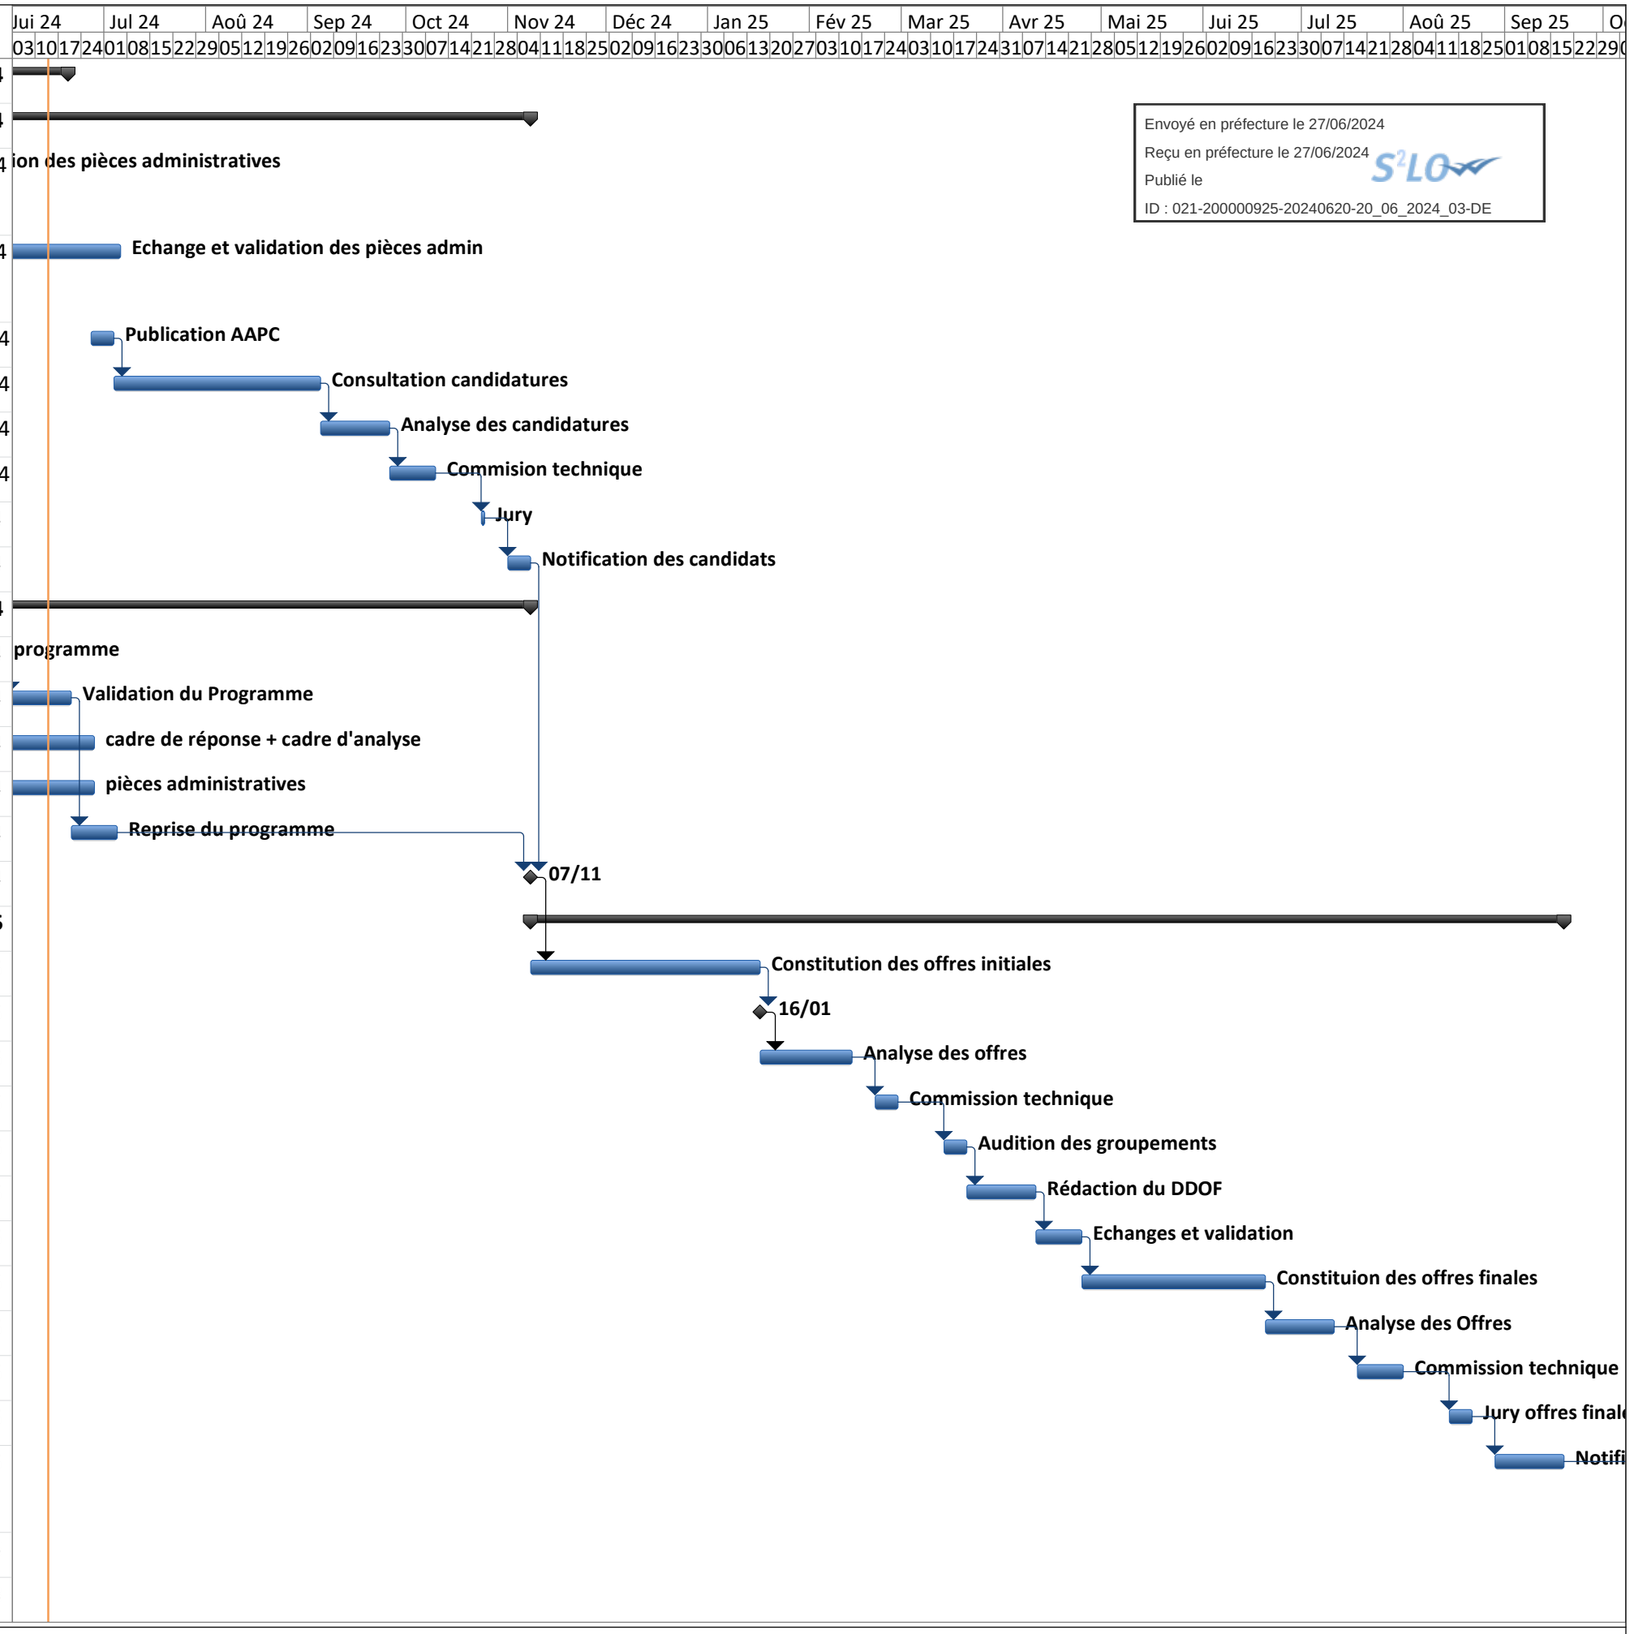

Envoyé en préfecture le 27/06/2024
Reçu en préfecture le 27/06/2024
Publié le
ID : 021-200000925-20240620-20_06_2024_03-DE
